

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2014

BIÊN BẢN THI CÔNG

Khai đào bóc xúc, đóng gói, xử lý rác thải, chất thải, đất nhiễm hoá chất BVTV còn sót lại tại Công ty CP Nicotex thanh Thái

Địa điểm: Khu Z4 – Xã Cẩm Vân – Huyện Cẩm Thủy – Tỉnh Thanh Hóa

Hạng mục: Khai đào, bóc xúc, đóng gói chất thải chất thải nhiễm thuốc BVTV 2 điểm còn sót lại tại khu vực thi công số 5.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA, GIÁM SÁT, NGHIỆM THU**1/ Công ty CP Nicotex Thanh Thái**

- Ông: Nguyễn Đình Thống - Chức vụ: Giám đốc

2/ Đại diện sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá.

1. Ông: Đào Văn Hùng – Chuyên viên Chi cục BVMT.

3/ Đại diện giám sát nhân dân:

1. Ông: Lê Đình Sơn – nơi thường trú: Xã Cẩm Vân – Huyện Cẩm Thủy.

2. Ông: Bùi Văn Anh – nơi thường trú: Xã Cẩm Tâm – Huyện Cẩm Thủy.


3. Ông: Phạm Viết Long – nơi thường trú: Xã Yên Lâm – Huyện Yên Định.

II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC THI CÔNG

Hiện trạng điểm số 1 và số 2 khu vực thi công số 5 (phía Đông tiếp giáp với vườn cây bạch đàn, phía Tây là khu vực số 5, phía Bắc tiếp giáp với điểm số 2, phía Nam vườn cây bạch đàn): Tại điểm chôn lấp số 1 và số 2 còn nguyên trạng ban đầu khi kiểm tra phát hiện ngày 28/3/2014.



Hình 1: Hiện trạng điểm số 1 trước khi khai đào

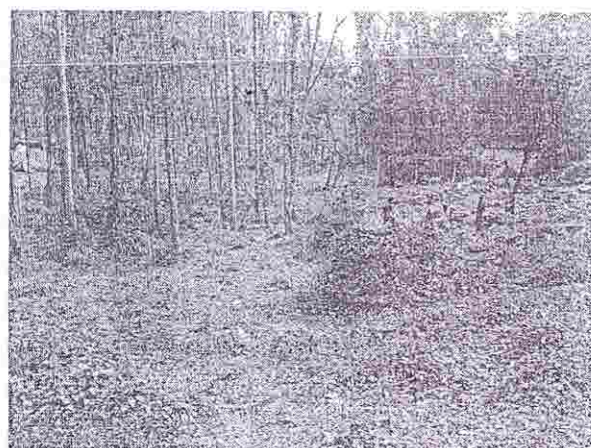

Hình 2: Hiện trạng điểm số 2 trước khi khai đào





Hình 3: Điểm số 1 khai đào bốc xúc chất thải, đất nhiễm



Hình 4: Điểm số 1 khai đào bốc xúc đóng gói chất thải, đất nhiễm

III. NỘI DUNG:

Công việc thực hiện ngày 23/5:

Công việc buổi sáng:

Thời gian làm việc: Bắt đầu làm việc từ 06 giờ đến 10 giờ kết thúc công việc buổi sáng:

+ Công tác chuẩn bị: Công nhân dọn dẹp mặt bằng và căng bạt phía trên khu vực thi công điểm số 1 che nắng và chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho việc khai đào, bốc xúc, đóng gói.

Công việc buổi chiều:

Thời gian làm việc: Bắt đầu làm việc từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30 kết thúc công việc buổi chiều và hoàn thành việc khai đào, bốc xúc đóng gói chất thải, đất nhiễm tại điểm số 1:

Bộ phận thi công chuẩn bị dụng cụ, cuốc xẻng, bao bì PP, sau đó tiến hành khai đào, bốc xúc đóng gói chất thải và đất nhiễm thuốc BVTV tại điểm số 1 vào bao PP bên trong có lót túi PE quy cách kích thước 70cm x 50cm.

Trong quá trình khai đào, bốc xúc công nhân thao tác bốc xúc chất thải và đất nhiễm thuốc BVTV trực tiếp từ hố vào bao PP chuẩn bị trước sau đó tập kết tạm bãi đất trống sát khu vực thi công.

Đến 17 giờ 30 kết thúc công việc buổi chiều và đã hoàn thành công việc khai đào, bốc xúc đóng gói chất thải, đất nhiễm tại điểm số 1, kích thước của hố đã khai đào (Chiều dài 1,7m x chiều rộng 1,5m x chiều sâu 1m) hiện tại hố đào chưa lấp đất.

• Kết quả đóng gói đất nhiễm thuốc BVTV tại điểm thi công số 01 như sau:

✓ 40 bao PP chứa đất nhiễm thuốc BVTV.

✓ Toàn bộ khối lượng đất nhiễm thuốc BVTV của điểm thi công số 01 được xếp vào nơi tập kết tạm tại bãi đất trống sát khu vực thi công, chưa xác định khối lượng và tiến hành đập bạt tránh mưa.

Công việc thực hiện ngày 24/5:

Công việc buổi sáng:

+ Công tác chuẩn bị: đầu giờ công nhân dọn dẹp mặt bằng và căng bạt phía trên khu vực thi công điểm số 2 che nắng và chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho việc khai đào, bốc xúc, đóng gói.

Thời gian làm việc: Bắt đầu làm việc từ 05 giờ 00 đến 10 giờ 00 kết thúc công việc sáng bộ phận thi công chuẩn bị dụng cụ, cuốc xẻng, bao bì PP, sau đó tiến hành khai đào, bốc xúc đóng gói chất thải và đất nhiễm thuốc BVTV tại điểm số 2 vào bao PP bên trong có lót túi PE quy cách kích thước 70cm x 50cm.

Trong quá trình khai đào, bốc xúc công nhân thao tác bốc xúc chất thải và đất nhiễm thuốc BVTV trực tiếp từ hố vào bao PP chuẩn bị trước sau đó tập kết tạm bãi đất trống sát khu vực thi công.

Khối lượng khai đào, đóng gói được 50 bao PP và thu gom được 1 bao nhỏ rác là dây buộc và một số giẻ lau (Chưa cân xác định số lượng).

Công việc buổi chiều:

Thời gian làm việc: Bắt đầu làm việc từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30 kết thúc công việc buổi chiều và hoàn thành việc khai đào, bốc xúc đóng gói chất thải, đất nhiễm tại điểm số 2:

Bộ phận thi công chuẩn bị dụng cụ, cuốc xẻng, bao bì PP, sau đó tiến hành khai đào, bốc xúc đóng gói chất thải và đất nhiễm thuốc BVTV tại điểm số 1 vào bao PP bên trong có lót túi PE quy cách kích thước 70cm x 50cm.

Trong quá trình khai đào, bốc xúc công nhân thao tác bốc xúc chất thải và đất nhiễm thuốc BVTV trực tiếp từ hố vào bao PP chuẩn bị trước sau đó tập kết tạm bãi đất trống sát khu vực thi công, Khối lượng khai đào, đóng gói được 45 bao PP và thu gom được 1 bao nhỏ rác là dây buộc và một số giẻ lau (Chưa cân xác định số lượng).

Đến 17 giờ 30 kết thúc công việc buổi chiều và đã hoàn thành công việc khai đào, bốc xúc đóng gói chất thải, đất nhiễm tại điểm số 2, kích thước của hố đã khai đào (Chiều dài 2,8m x chiều rộng 1,4m x chiều sâu 70m) hiện tại hố đào chưa lấp đất.

• Kết quả đóng gói đất nhiễm thuốc BVTV tại điểm thi công số 01 như sau:

- ✓ 45 bao PP chứa đất nhiễm thuốc BVTV.
- ✓ 1 bao rác thải gồm dây buộc và giẻ.
- ✓ Toàn bộ khối lượng đất nhiễm thuốc BVTV và giẻ lau của điểm thi công số 02 được xếp vào nơi tập kết tạm tại bãi đất trống sát khu vực thi công, chưa xác định khối lượng và tiến hành đập bạt tránh mưa.

Ngày 25/5/2014.

Thời gian làm việc: Bắt đầu làm việc từ 06 giờ đến 10 giờ kết thúc công việc buổi sáng:

Công nhân vận chuyển các bao đất nhiễm và chất thải về khu vực tập kết tại nhà để phuy cũ và cân xác định khối lượng của hai vị trí đã khai đào đóng gói vào bao PP cụ thể như sau:

1. Điểm số 1: Tổng số 40 bao PP đất nhiễm HCBVTV với tổng khối lượng 1.205 Kg.

2. Điểm số 2: Tổng số 95 bao PP đất nhiễm HCBVTV với tổng khối lượng 2.886Kg và 02 bao rác với tổng khối lượng 10 kg.

Theo đề nghị của tổ giám sát đại diện nhân dân đào xới mở rộng thêm bề mặt bên cạnh khu vực của của điểm số 2, đào sâu để tìm kiếm xem còn sót chất thải chôn dưới lòng đất nữa hay không, đã được Công ty CP Nicotex Thanh Thái kiểm tra đầy đủ, khách quan bằng phương tiện thủ công dùng xẻng, cuốc đào sâu tới nền đất nguyên thổ không phát hiện thêm và cũng không có chất thải, rác thải tại vị trí của 02 điểm này ngoài vị trí đã khai đào, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của đại diện giám sát nhân dân đưa ra.

IV. KẾT LUẬN.

Trong quá trình thi công khai đào, bốc xúc, đóng gói và lưu giữ chất thải, đất nhiễm hoá chất BVTV tại 02 điểm phát sinh còn sót lại của Khu vực thi công số 5, Công ty CP Nicotex Thanh Thái đã thực hiện nghiêm túc theo như phương án thi công đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá phê duyệt. Đất nhiễm hoá chất BVTV và chất thải chôn lấp tại 02 điểm thi công nói trên đã được khai đào, thu gom đóng gói hết và chuyển về nhà kho của Công ty để bảo quản chờ xử lý cùng giai đoạn 2.

Biên bản kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2014. Đã thông qua các bên thống nhất nội dung biên bản và đồng ý ký tên.

Biên bản này được lập thành 09 bản, có nội dung pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, lưu hồ sơ và gửi các cơ quan chuyên môn của tỉnh để báo cáo.

CÔNG TY CP
NICOTEX THANH THÁI



Giám đốc
Nguyễn Đình Thống

SỞ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG THANH HOÁ

C/V Chi cục BVMT
Đào Văn Hùng

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT NHÂN DÂN

XÃ CÂM VÂN
HUYỆN CẨM THỦY

Lê Đình Sơn

XÃ CẨM TÂM
HUYỆN CẨM THỦY

Bùi Văn Anh

XÃ YÊN LÂM
HUYỆN YÊN ĐỊNH

Phạm Việt Long
